


Keskustan liikuntapuisto

Hankesuunnitelma

Hyvo 6.4.2022




Järvenpää

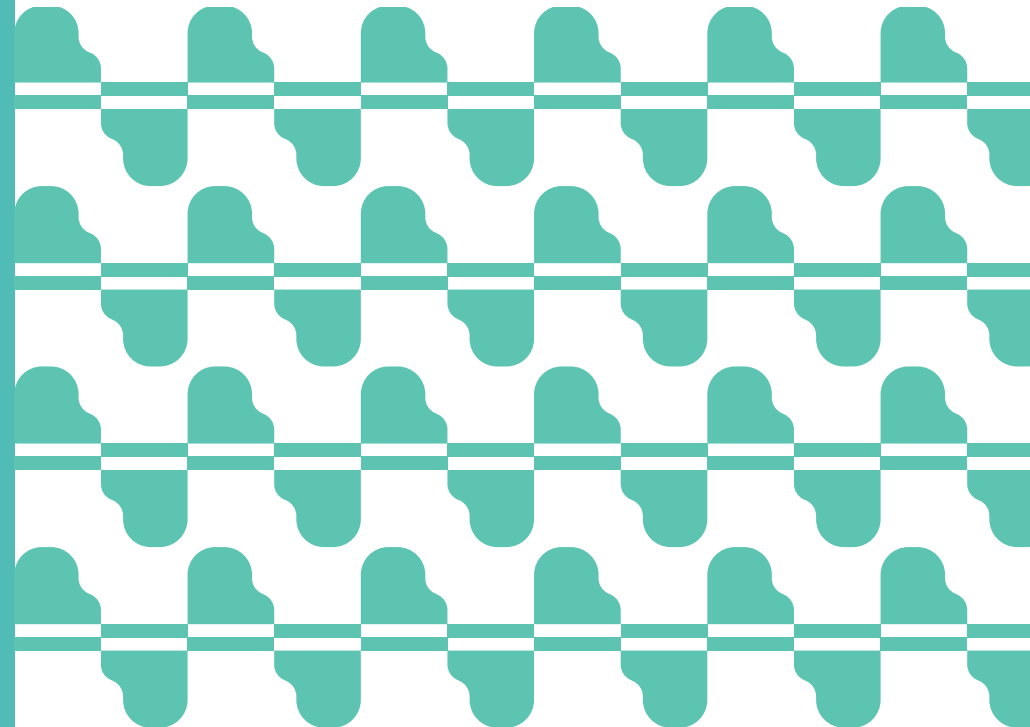


Tausta

- Keskustan liikuntapuiston yleissuunnitelma on laadittu Järvenpään kaupungin toimeksiannosta 2019 - 2020.
 - Suunnitelmaselostus 17.1.2020 on käsitelty Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 27.2.2020, §14, lautakunta päätti:
 - merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 - esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.
- Hankkeen eteneminen keskeytyi tämän jälkeen keväällä 2020.
- Viereinen kuva Suunnitelmaselostuksen 17.1.2020 asemapiirustus.

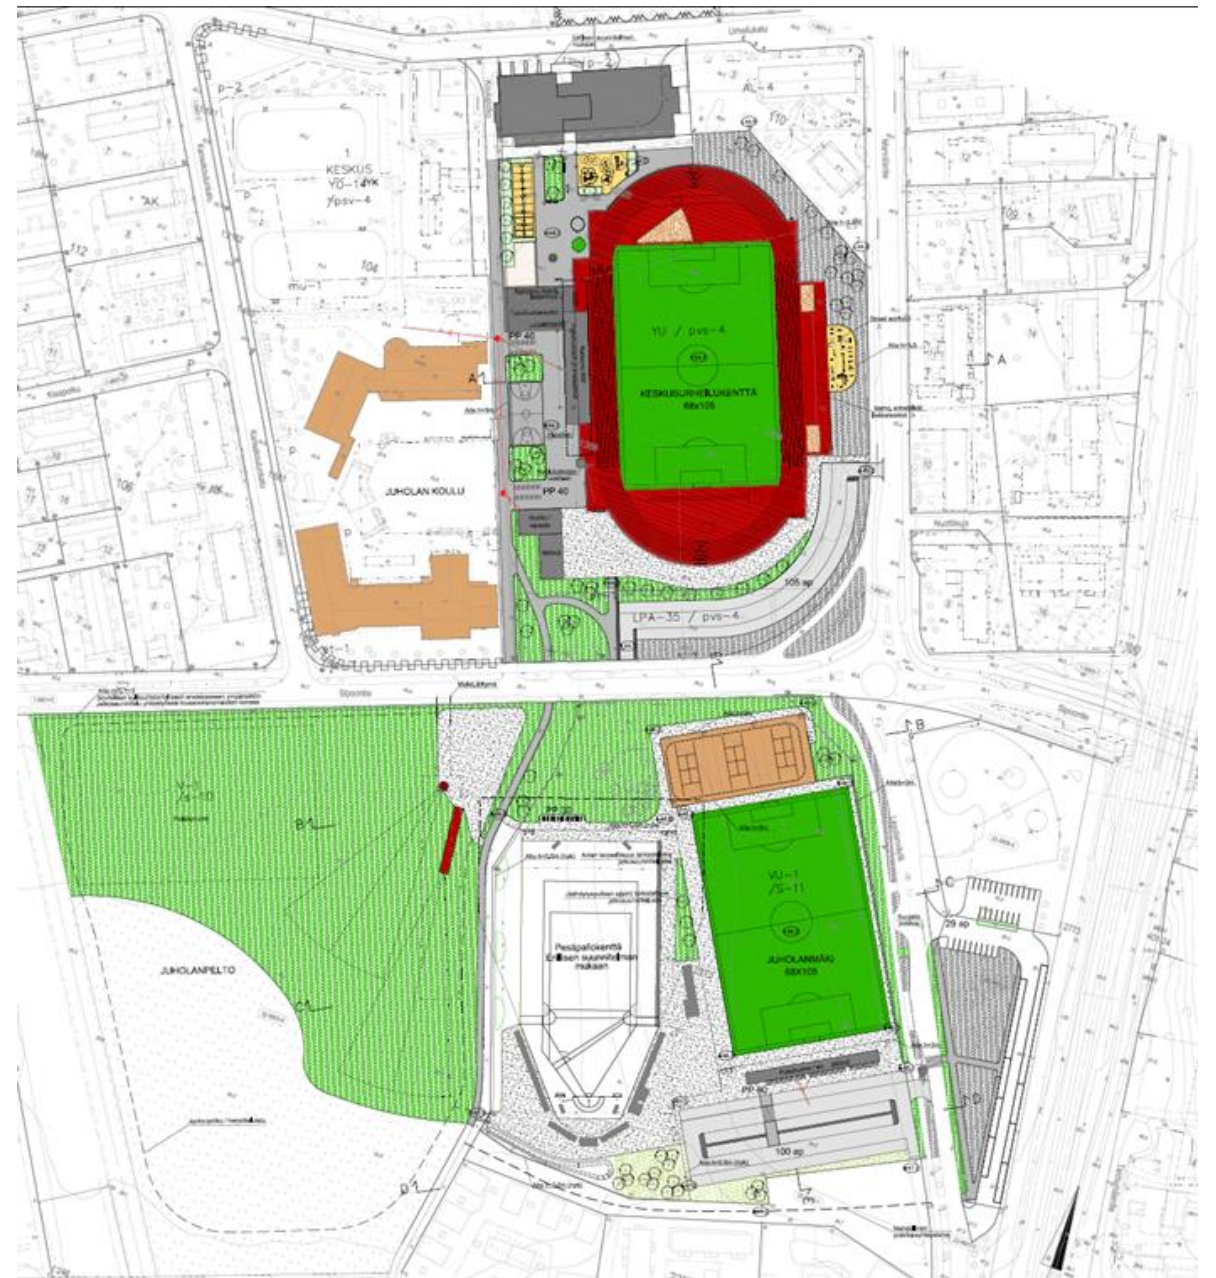

Hankesuunnitelman laadinta

- Hankkeen valmistelua on jatkettu syksyllä 2021 kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen ja Mestaritoiminnan yhteistyöllä, Mestaritoiminnalla on apuna hankesuunnitelman laadinnassa liikuntapaikkojen suunnitteluun erikoistunut konsultti Ramboll.
- 2021-2022 talven aikana on kartoitettu kaupungin liikuntapalveluiden sekä liikuntapuiston keskeisten käyttäjien muuttuneita toiminnallisia tarpeita, joiden perusteella suunnitelmaa on tarkistettu ja täsmennetty tarpeita vastaaviksi.
- Hankesuunnitelman laadintaa ohjaa aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa laadittu suunnitelmaselostus.

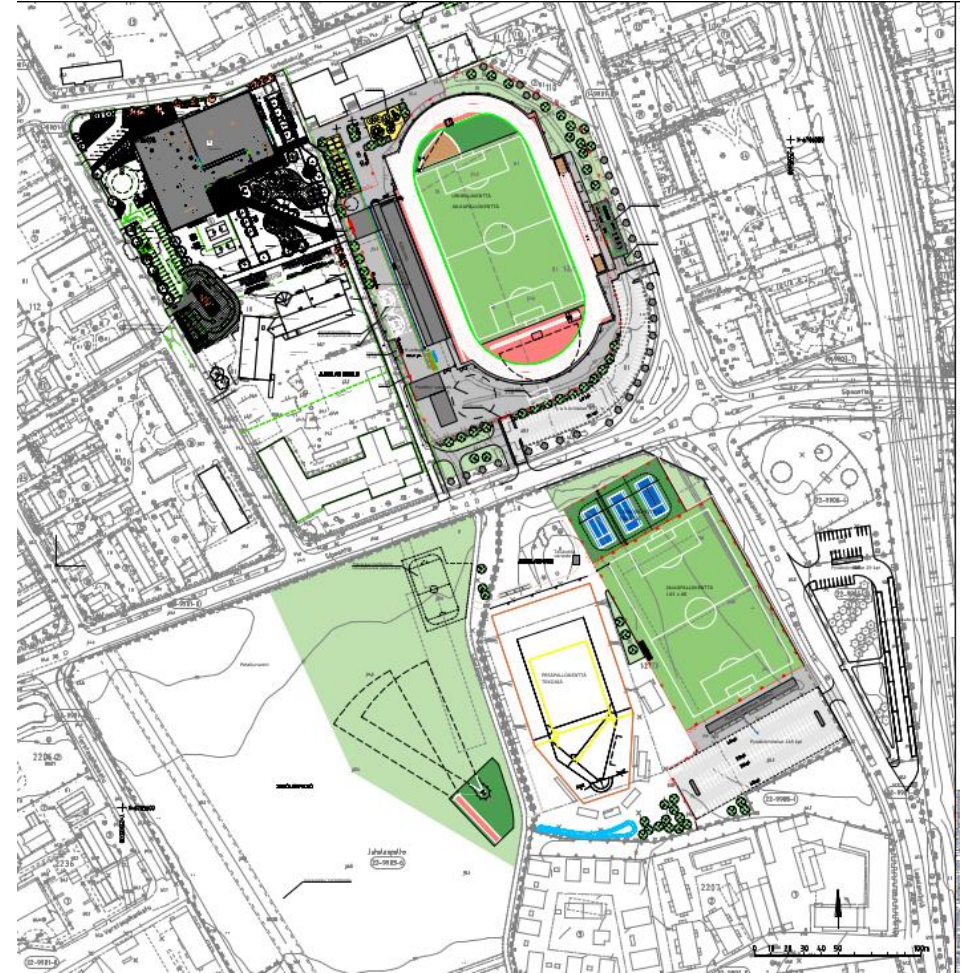

Asemapiirustus
25.3.2022,
asemapiirustusote
Juholan pelto



Vaiheistus ja päätöksenteko

- Hanketta esitetään päätöksentekoon vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa haetaan päätös kokonaisuuden toiminnallisuudesta (Hyvo), investointibudjetin päivitys (KH, valtuusto) sekä toteutussuunnittelun aloituspäätös (KH). Hankeen rakentaminen on investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2023-2026.
- Vallitsevan maailmantilanteen vaikutuksista rakentamisen yleiseen kustannustasoon sekä materiaalien saatavuuteen rakentamisen käynnistyspäätökset haetaan erikseen ja tämän hetkisen tiedon mukaan kahdessa tai useammassa vaiheessa.
- Aikataulu
 - Kokonaisuuden suunnittelu alkaen 5-6/2022.
 - 1. vaiheen rakentamisen päätöksenteko alustavasti 8-9/2022.
 - 1. vaiheen rakentaminen alkaen talvella 2022-2023 tai keväällä 2023.
 - Myöhempien rakennusvaiheiden aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Liikuntapuiston rakentaminen toteutetaan kahdessa tai useammassa vaiheessa

Kiitos!
