


Vihtakadun päiväkotihankesuunnitelma

Kaupunginhallitus 3.4.2023



Järvenpää

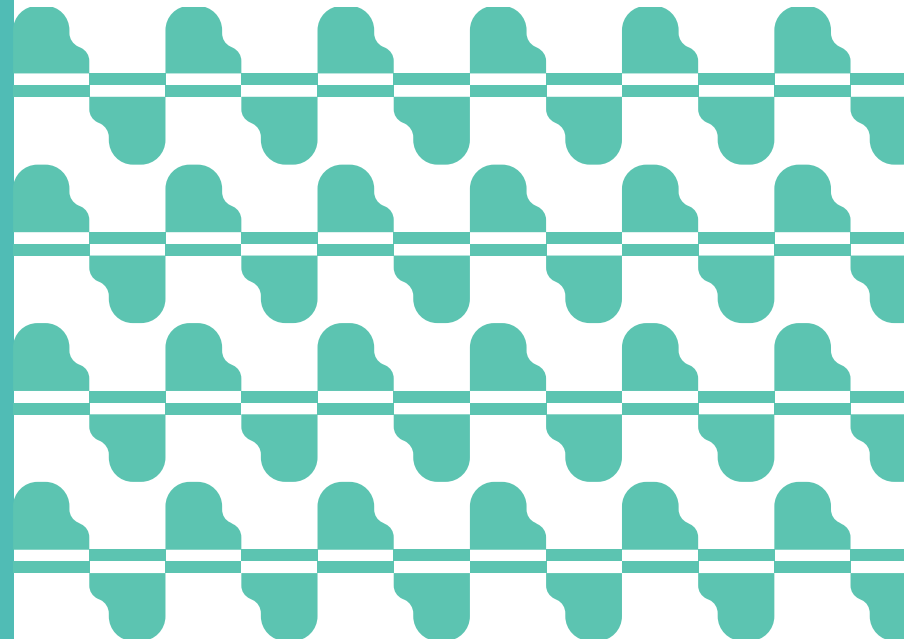

Vuonna 2021 tehty päätös Vihtakadun koulun muuttamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön


- Vihtakadun päiväkodin hankkeen valmistelu on aloitettu 2021. Päätös kaupunginhallituksen kokous 1.11.2021.
- Päätöksen taustalla on tutkittu vaihtoehtoja 1 ja 2 (OPKA palveluverkon taloudellinen selvitys 22.9.2021).
 - Vaihtoehdossa 1 Vihtakadun yksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusaunan päiväkodista luovutaan
 - Vaihtoehdossa 2 Vihtakadun yksikköä ei oteta varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusaunan päiväkoti pidetään

-> **Päätetty vaihtoehto 1:** Vihtakadun yksikkö otetaan varhaiskasvatuksen käyttöön ja Satusaunan päiväkodista luovutaan.

Päätöksen taustaa:

- Vihtakatu on pinta-alaltaan kolme kertaa Satusaunaa suurempi (2359 ja 836 brm²). Vihtakadun suuremman koon vuoksi, tällä vaihtoehdolla saadaan kolme ryhmää enemmän.
 - Satusaunan päiväkoti on peruskorjauksiässä ja peruskorjauksessa kaikkia rakennuksen riskirakenteita ei pystytä korjaamaan vaan osa joudutaan kapseloimaan.
- Vihtakadun hankkeen valmistuttua varhaiskasvatuspaikkojen kapasiteetti riittää 2030-luvun alkuun.

*Vihtakadun koulu muutetaan
päiväkodiksi*

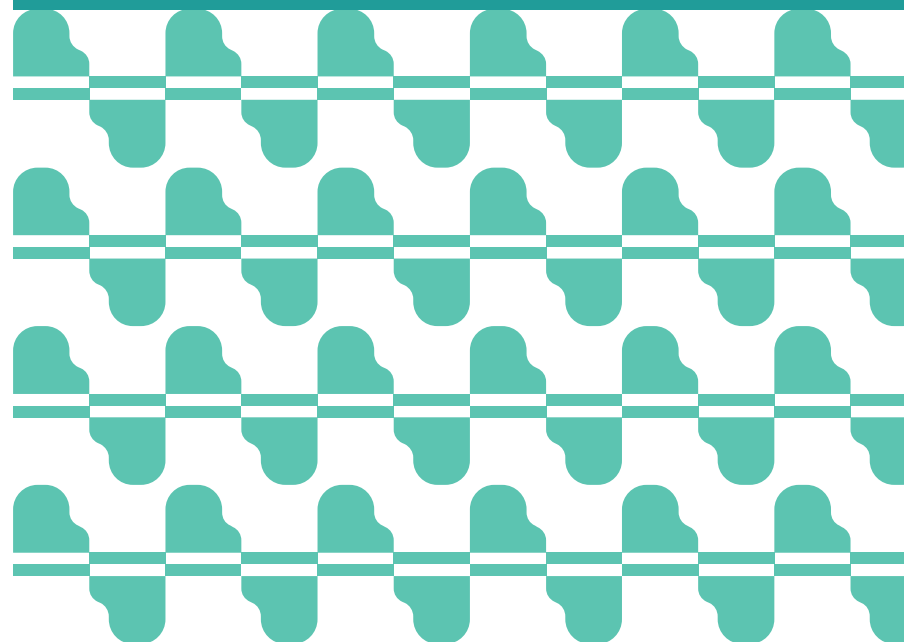

Vihtakadun päiväkodin hankesuunnitelman käsittely ja päätöksenteko

- INKAJR 16.2.2023
- Kaupunginhallituksen iltakoulu 6.3.2023
- Opetus- ja kasvatustalokunta 21.3.2023
- Kaupunginhallitus 3.4.2023

*Vihtakadun päiväkodin
pätöksentekoaikataulu*

Vihtakadun päiväkodin toteutusaikataulu

- Hankesuunnitelman laadinta 9 /2022 - 1 / 2023.
- Kaupungin päätöksenteko 3-4 / 2023.
- Suunnittelun aloitus 3-4 / 2023.
- Purku-urakan kilpailutus alustavasti 5 / 2023.
- Purku-urakan aloitus 6 / 2023.
- Rakennusurakan kilpailutus alustavasti 7 – 9 / 2023.
- Rakennusurakan aloitus 10 / 2023.
- Käyttäjän toiminnan aloitus 1 / 2025.

*Vihtakadun päiväkoti valmis
vuoden 2025 alussa*

Hankesuunnitelman tiivistelmä

Hankesuunnitelman tarkoituksena on kuvata hankkeen ominaispiirteet, tarve ja tavoitteet, kustannukset sekä menettely.

Tarpeen kuvaus, Hankkeella vastataan mm. palveluverkosta poistuvan Satusaunan päiväkodin tilatarpeeseen, sekä voimakkaasti kohonneeseen alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen. Tiloihin sijoitetaan 8-ryhmäinen päiväkot.

Liittyminen muihin hankkeisiin ja selvityksiin, Hanke perustuu vuonna 2021 hyväksytyyn varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaan. Hanke mahdollistaa hyväkuntoisten tilojen jatkokäytön sekä lisää palveluverkkoon yhteiskäyttötiloja kuntalaisille.

OPKA:n valmisteleman palveluverkkoselvityksen mukaan muita Järvenpään eteläisellä alueella toteutettavia varhaiskasvatus- ja kouluhankkeita ovat Harjulan koulu ja päiväkot (valmis), JYK ja Kansakoulunkatu 1 (hanke käynnissä), Oinaskadun päiväkot ja koulu (hanke käynnissä) sekä Ainolan koulu (2030-luvulla).

Tarpeen perustelut, Tiloihin tulee sijoittumaan 8-ryhmäinen päiväkot, joka korvaa mm. palveluverkosta poistuvan Satusaunan päiväkodin.

Vihtakadun hanke on tunnistettu kiireelliseksi. Syksyllä 2022 alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisaste varhaiskasvatuksen nousi lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä. Mikäli hanke viivästyisi tai jäisi toteutumatta, olisi sillä välittömiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen palveluntuotantoon

Opetus- ja kasvatuslautakunnan päätöksen mukaiset muutosesitykset

- **Hankesuunnitelma täydennetty esitysten mukaiseksi**

- Muutosesitys 1: Hankesuunnitelmaan kappaleen 5.2. Kirjaus "Päiväkodin sisäilman tulee olla terveellinen ja turvallinen, jolloin pintamateriaalien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota." Korvataan kirjauksella "Päiväkodin sisäilman tulee olla terveellinen ja turvallinen, ja sisätiloihin määritettävien pintamateriaalien tulee olla vähäpäästöisiä (esimerkiksi M1-luokitus)".
- Muutosesitys 2: Lisätään kappaleeseen 5.4 kirjaus: "Suunnitteluvaiheessa tarkastellaan mahdollisuus päiväkotikäytön ulkopuoliseen käyttöön suunniteltujen tilojen ilmanvaihdon ohjaukselle CO2-mittaukseen perustuen tai valmius tehostaa ilmanvaihtoa tilojen käyttöaikojen mukaisesti, esim. sähköisen varauskalenterin mukaisesti."
- Muutosesitys 3: • Muutetaan kappaletta 5.6. Energiatavoitteet seuraavasti: Lause "Kohteen lämmitysmuoto on kaukolämpöjärjestelmä" korvataan lauseilla: "Kohteen nykyinen lämmitysmuoto on kaukolämpöjärjestelmä. Osana suunnittelua tarkastellaan vaihtoehtona lämmöntuotannon vaihto lämpöpumppuratkaisuun (esim. maalämpö), ja valitaan lämmöntuotantotavaksi elinkaarikustannuksiltaan edullisin vaihtoehto."
- Muutosesitys 4: Lisätään hankesuunnitelman lukuun 8 "Keskeiset hankkeen toimintatavat" kappale, jossa kuvataan suunnitelma eri osapuolien osallistamiselle sekä hankekohtainen osallistamisen aikataulu.
 - "Talonrakennushankkeisiin osallistaminen" -dokumentti lisätty hankesuunnitelman liitteisiin.

Varhaiskasvatuksen tavoitteet

- Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta tukevat tilat, välineet ja tarvikkeet kuuluvat oppimisympäristöön. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.
- Tilojen tulee varmistaa lapsille mahdollisuus monipuoliseen päivittäiseen liikkumiseen. Tiloihin sijoittuu monipuolisia ja turvallisia leikki- ja toimintavälineitä. Niin sisätiloja kuin pihaa sekä ympäristön metsiä, liikuntapaikkoja ja leikkipuistoja hyödynnetään aktiivisessa toiminnassa. Ne tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen sekä liikunta- ja luontoelämyksiin.

*Varhaiskasvatuksen
tavoitteita on kuvattu
yksityiskohtaisesti
pedagogisessa visiossa*

Tilatehokkuus

- Päiväkoti on pedagogisessa suunnitelmassa määritelty 8 ryhmäiseksi max lapsimäärä 168 lasta
- Päiväkodin käyttöön tulevat tilat alustavan suunnitelman mukaisesti 1635,5m², tämä tarkoittaa 9,7 hum²/lapsi.
- Tilatehokkuutta parantamalla Vihtakadun rakennuksen tiloihin saataisiin mahtumaan mahdollisesti yksi lisäryhmä
 - Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkastellaan vaihtoehtona, saadaanko rakennukseen mahtumaan 9 ryhmää.
 - Rakentamiskustannuksiin tällä muutoksella ei olisi merkittävää vaikutusta.
 - Rakennuksen muoto ja mm. olemassa olevat sisäänkäynnit määrittelevät omalta osaltaan myös tilatehokkuutta.

*Vihtakadun päiväkoti on
pedagogisessa
suunnitelmassa määritelty 8
ryhmäiseksi*

Liikuntatilat

Rakennuksessa on n. 210 m² liikuntasali varasto- ja puku- ja pesuhuonetiloihin. Sali soveltuu etenkin pienten liikuntaan, muutamaa päivänavausten ja muiden yhteisten hetkien pitämiseen.

Liikuntasali on jaettavissa kahteen lohkoksi, jolloin sitä voidaan hyödyntää samanaikaisesti kahteen eri toimintaan. Liikuntasali toimii myös kokoontumistilana. Varusteiden sijoittelussa ja säilytyksessä lähtökohtana on erillinen varasto, jossa huomioidaan säilytysratkaisut.

Salissa on kiipeilyseinä ja puolapuut. Kiipeilyrenkaat ja -köydet on sijoitettu salin sivulle, jotta keskitilaa jää riittävästi. Tontin itäpuolella on kiinteistöön kuuluva metsäalue, joka mahdollistaa monipuolisen ja monimuotoisen lasten liikunnan.

Piha-alueelta löytyy ulkoliikuntavälinevarasto.

*Rakennuksessa on n. 210 m²
liikuntasali*

Ilta- ja viikonloppukäyttö

- Ilta, viikonloppu ja loma-ajantoimintaa on rakennuksessa läpi vuoden, kesäkuu – elokuu välillä vähemmän. Päiväkodin tilat tulevat mahdollistamaan monipuolisen toiminnan harjoittamisen myös opetustoiminnan ulkopuolella. Lähtökohtaisesti tälle toiminnalle riittää koulutoiminnan tiloille asettamat sisäilmaolosuhdevaatimukset.

Ilta- ja viikonloppukäyttö



Verstastila

- Nykyisen teknisen tilan luokan sijainnille tehdään varaukset mahdollista tulevaa kaupungin kalusteiden kunnostus toimintaa varten.
- Verstastilan rakenteet suunnitellaan, siten että tilassa tehtävät ääntä aiheuttavat työt aiheuta häiriötä päiväkodin toiminnalle.
- Verstastilan ilmanvaihto toteutetaan omalla ilmanvaihtokoneella.
- Verstaan toiminta-ajatus tarkentuu hankkeen edetessä.

Verstas



Piha-alueet

Toiminnallinen piha-alue

- Piha-alue on osa Vihtakadun yksikköä ja se mahdollistaa leikkimisen ja oppimisen 0–6-vuotiaille lapsille erilaisin virikkein ja liikuntatoimintamahdollisuuksin.
- Pihan maasto on monipuolinen ja monimuotoinen. Piha tukee lapsen luontaista motorista kehitystä ja tutkimisen halua.
- Piha on täysin aidattu, mutta kulkuyhteydet puistoalueeseen ovat hyvät ja turvalliset. Kulku pihalle tapahtuu monesta suunnasta kuitenkin siten, että portit ovat turvallisia ja helposti valvottavia.

Saattoliikenne ja autopaikoitus

- Pihalle sijoitetaan saattoliikenteen, henkilökunnan, liikuntatilaisuuksien ja muun toiminnan tarpeet täyttävä pysäköintitarkaisu.
- Saattoliikennepaikkoja toteutetaan molemmille puolille rakennusta, sekä hyödynnetään viereisen liikuntakentän paikoitusalueita

Polkupyöräpaikat

- Rakennuksen ympäristöön toteutetaan n. 20 runkolukitusmahdollisuudella olevaa polkupyöräpaikkaa. Osa katettuina.

